

STRONA TYTUŁOWA
PROJEKT ROZBIÓRKI

PODSTAWOWE DANE:

INWESTOR:	GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE UL. RYNEK 8 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	ROZBIÓRKA MAGAZYNU PIWNICZNEGO
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	42-610 ŻYGLIN UL. OKÓLNA 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 241302_1 MIASTECZKO ŚLĄSKIE NAZWA I NR OBRĘBU EWID.: 0004 ŻYGLIN NR DZIAŁKI BUDOWLANEJ: 1273/366
DATA OPRACOWANIA:	CZERWIEC 2026 R.

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ WRĘCZYCKI	DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR UPR.: 19/SLOKK/2015	ARCHITEKTURA	CZERWIEC 2026 R.	
PROJEKTANT	MGR INŻ. KRZYSZTOF GAWROŃSKI	DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ NR UPR.: 136/2001	KONSTRUKCJA	CZERWIEC 2026 R.	

Nie wniesiono sprzeciwu
Data 12.07.2026

.....
 (podpis)

Załącznik do 28.05.2026
nr BA-6743.2.20.2026
z dnia 03.07.2026

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnowskich Górach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ul. Karłowicz 5

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ROZBIÓRKI
PODSTAWOWE DANE:

INWESTOR:	GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE UL. RYNEK 8 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	ROZBIÓRKA MAGAZYNU PIWNICZNEGO
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	42-610 ŻYGLIN UL. OKÓLNA 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 241302_1 MIASTECZKO ŚLĄSKIE NAZWA I NR OBRĘBU EWID.: 0004 ŻYGLIN NR DZIAŁKI BUDOWLANEJ: 1273/366
DATA OPRACOWANIA:	CZERWIEC 2026 R.

Oświadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane, że niniejszy projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ WRĘCZYCKI	DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR UPR.: 19/SLOKK/2015	ARCHITEKTURA	CZERWIEC 2026 R.	
PROJEKTANT	MGR INŻ. KRZYSZTOF GAWROŃSKI	DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ NR UPR.: 136/2001	KONSTRUKCJA	CZERWIEC 2026 R.	

**SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU**

1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI
2. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ROZBIÓRKI	2
OPIS TECHNICZNY	8
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA	8
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA	8
2 PROJEKT ROZBIÓRKI	8
2.1 PODSTAWOWE DANE	8
2.1.1 OPIS OGÓLNY	8
2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU	8
2.3 STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	9
2.3.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU	9
2.4 ROZBIÓRKA BUDYNKU	11
2.4.1 PROJEKTUJE SIĘ ROZBIÓRKĘ METODĄ TRADYCYJNĄ W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI	12
2.4.2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIÓRKI.	12
2.5 INSTALACJE	12
2.5.1 UWAGI	13
2.6 UWAGI KOŃCOWE	13
3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13
3.1 SPIS RYSUNKÓW	13
4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	14
4.1 PODSTAWY FORMALNE SPORZĄDZENIA INFORMACJI:	14
4.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	14
4.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (NP. SIECI)	14
4.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	14
4.5 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	14
4.6 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW	15
4.7 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM	15

OPIS TECHNICZNY**1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki magazynu piwnicznego, na działce nr ewid. 1273/366, położonej w miejscowości Żyglin Ul. Okólna 1, obręb 0004 Żyglin, jednostka ewidencyjna 241302_1 Miasteczko Śląskie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna
- Umowa z inwestorem
- Inwentaryzacja w terenie
- Polskie Normy i przepisy branżowe
- Mapa zasadnicza
- Uzgodnienia między branżowe

2 PROJEKT ROZBIÓRKI**2.1 PODSTAWOWE DANE**

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki magazynu piwnicznego, na działce nr ewid. 1273/366, położonej w miejscowości Żyglin Ul. Okólna 1, obręb 0004 Żyglin, jednostka ewidencyjna 241302_1 Miasteczko Śląskie.

Magazyn piwniczny nr 325 o identyfikatorze 241302_1.0004.325_BUD.

2.1.1 OPIS OGÓLNY

Magazyn piwniczny nr 325 o identyfikatorze 241302_1.0004.325_BUD.

Rzut budynku ma kształt prostokąta. Budynek wolnostojący. Wymiary budynku (do rozbiórki): długość 9,5 m, szerokość 6,32 m, wysokość 1,80 m oraz 1,20m do attyki budynku od poziomu terenu

Budynek wejście główne ma zagłębione w stosunku do poziomu terenu, na dach budynku prowadzi schody zewnętrzne. Dach pełni funkcje sceny/tarasu, przestrzeń wygrodzono barierkami stalowymi.

2.1.1.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE BUDYNKOW

- Ławy fundamentowe z bloczków betonowych oraz cegły
- Ściany z cegły oraz pustaków żużlowych.
- Strop monolityczny wsparty na dźwigarach stalowych
- Nadproża ceglane oraz stalowe

2.1.1.2 WYKONCZENIE BUDYNKÓW

- Pokrycie dachu – dach bez pokrycia, nawierzchnia betonowa malowana farbami zabezpieczającymi przeciwwilgociowo
- Posadzki betonowe

2.1.1.3 POWIĄZANIE Z SĄSIEDNIMI BUDYNKAMI

Budynek 241302_1.0004.325_BUD. wolnostojący nie powiązany ścianami z budynkami znajdującymi się na działce inwestycyjnej oraz sąsiednich działkach budowlanych.

2.1.1.4 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE

- Instalacja elektryczna – tak

2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU**241302_1.0004.325_BUD**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

60,00 m²

KUBATURA



108,00 m³

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	51,84 m ²
DŁUGOŚĆ	9,50 m
SZEROKOŚĆ	6,32 m
WYSOKOŚĆ	1,80 m

2.3 STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

2.3.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU



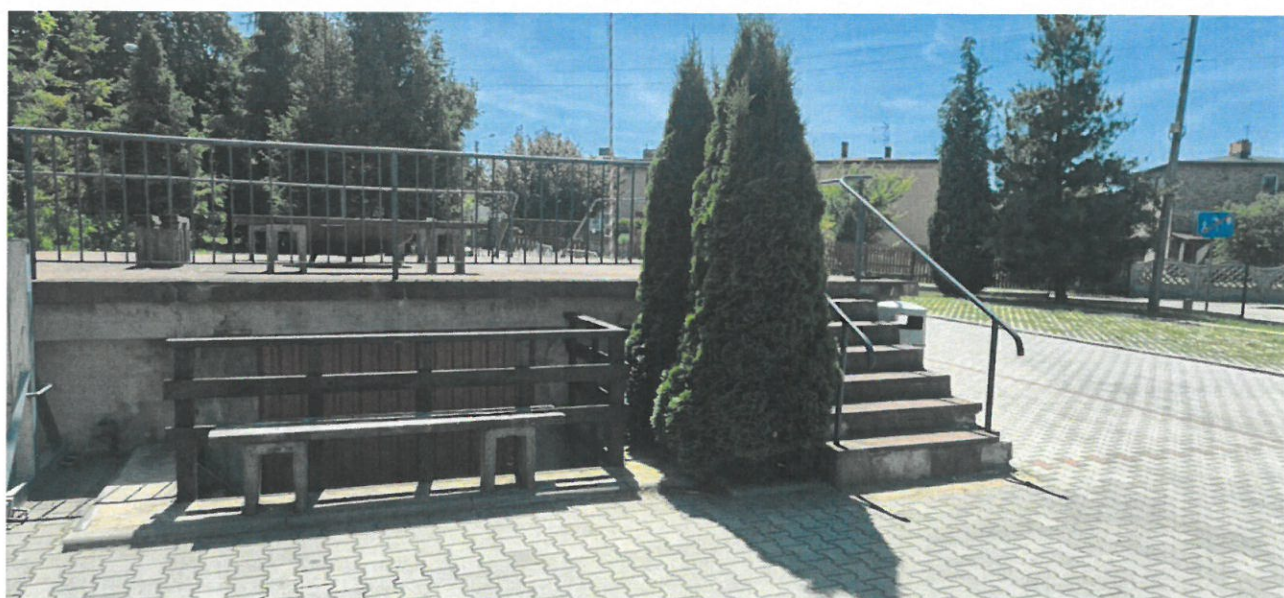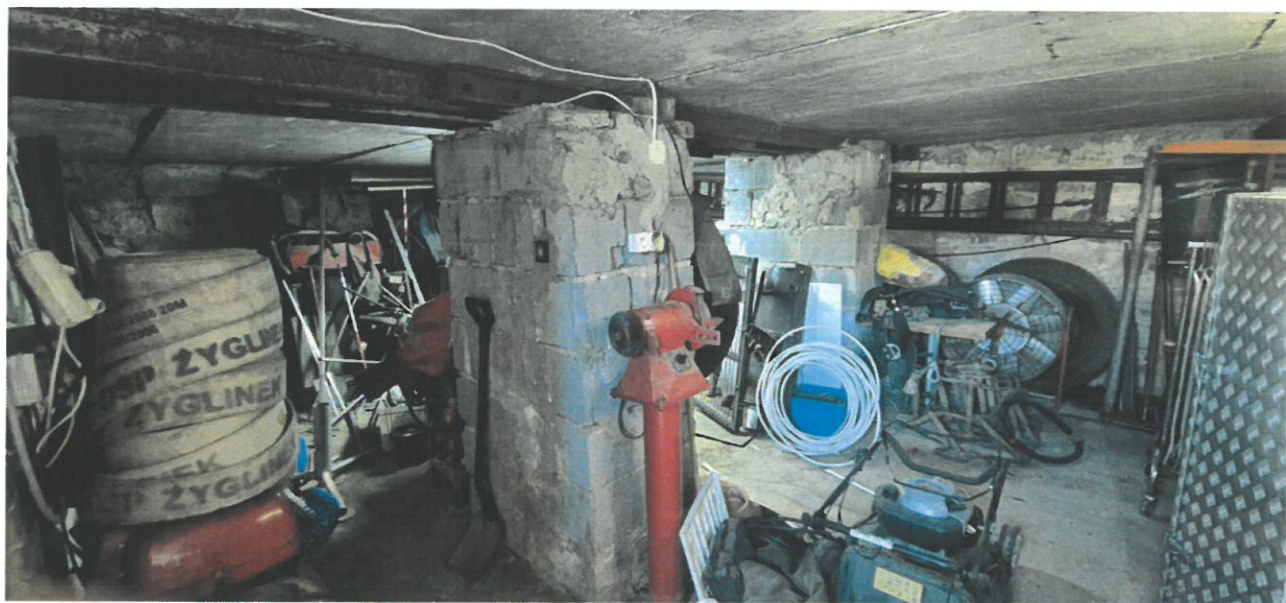



2.4 ROZBIÓRKA BUDYNKU

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki wygradzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejącej instalacji energetycznych biegnącej od istniejącego budynku OSP.

Stan techniczny wykonanego elementu budowlanego jest średnio dobry na skutek wieloletnich oddziaływań atmosferycznych.

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren rozbiórki przed dostępem osób niepowołanych.

Prace rozbiórkowe można prowadzić metodą ręczną lub metodą mechaniczną, np. z wykorzystaniem koparki. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych metodą mechaniczną należy zachować ostrożność.

Ze względu na zły stan techniczny wykonywanego elementu budowlanego nie przewiduje się ponownego wykorzystania materiałów pochodzącego z rozbiórki. Materiały te, jako gruz budowlanych należy wywieźć na przewidziane do tego celu wysypisko.

Powstały wykop po likwidacji budynku należy zasypać piaskiem i zagęścić mechanicznie

2.4.1 PROJEKTUJE SIĘ ROZBIÓRKĘ METODĄ TRADYCYJNĄ W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI

- Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rozbiórka stolarki drzwiowej.

Skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru.

- Rozbiórka barierek i obróbek metalowych.

Rozbiórkę barierek i obróbek metalowych prowadzić ręcznie oraz za pomocą środków mechanicznych.

- Rozbiórka stropodachu.

Stropodach rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć

- Rozbiórka ścian zewnętrznych.

Sukcesywnie z rozbiórką stropu dokonywać rozbiórki ścian parteru. Rozbiórka słupów wewnętrznych prowadzić równolegle ze ścianami zewnętrznymi.

- Rozbiórka fundamentów i podmurówek.

Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym.

- Segregacja odpadów, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

2.4.2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIÓRKI.

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych.

- Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
- Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.
- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.
- Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru.
- Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.
- Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.
- Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 5 m od budynku oraz na bieżąco usuwać powstały gruz.
- Zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce stropodachu
- Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinni znajdować się poza strefą niebezpieczną,
- Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko

2.5 INSTALACJE

Do budynków podłączone są instalacje energetyczne, będące częścią wewnętrznych instalacji, nie wymagających uzgodnienia likwidacji z zarządcą sieci.

2.5.1 UWAGI



Należy pamiętać o sprawdzeniu przebiegu ww. instalacji podczas wykonywania poszczególnych etapów rozbiórki.

2.6 UWAGI KOŃCOWE

- Niniejszy projekt został opracowany celem zgłoszenia projektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i zarządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.
- Wszelkie zawarte na rysunku wymiary należy przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić w terenie na placu budowy. Zaleca się aby nie używać wymiarów skalowanych z rysunku tylko te, które są na nim podane. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA**3.1 SPIS RYSUNKÓW**

RYS.:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
Z1	PLAN SYTUACYJNY	1:500
A1	PLAN BUDYNKU	1:100

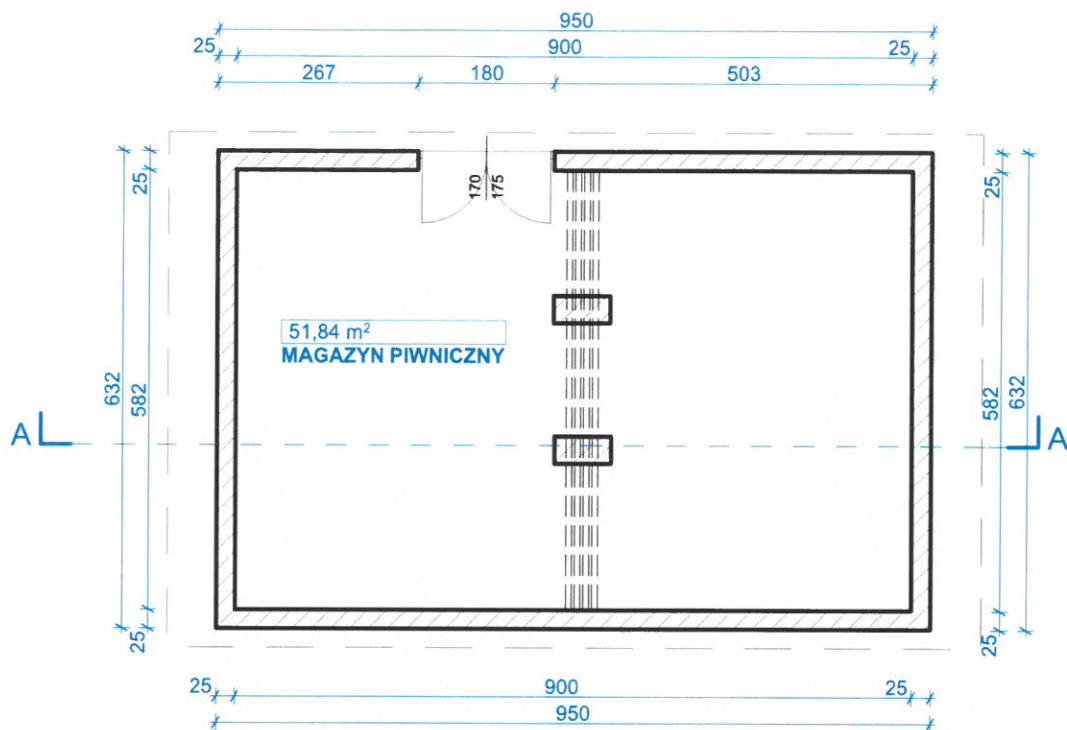

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnowskich Górach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ul. Karłuszowiec 5

DELTOID pracownia architektoniczna
ul. Miodowa 8, 42-289 Woźniki



Nazwa inwestycji:
ROZBIÓRKA MAGAZYNU PIWNICZNEGO

Inwestor:
GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
UL. RYNEK 8, 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE

Projektował:	nr uprawnień	podpis	Opracował:
M. Wręczycki	19/SLOKK/2015		M. Wręczycki
Projektował:	nr uprawnień	podpis	
K. Gawroński	136/2001		
Faza:	Skala:	Data: CZERWIEC 2026 R.	Rewizja:
PAB	1:100	Format druku: A3	-
Temat rysunku:	PLAN BUDYNKU		Nr Rys.
			A1

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończenia i chroniony jest ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej DELTOID. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności: należy zwrócić się do projektanta.

4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODSTAWOWE DANE

INWESTOR:	GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE UL. RYNEK 8 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	ROZBIÓRKA MAGAZYNU PIWNICZNEGO
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	42-610 ŻYGLIN UL. OKÓLNA 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 241302_1 MIASTECZKO ŚLĄSKIE NAZWA I NR OBRĘBU EWID.: 0004 ŻYGLIN NR DZIAŁKI BUDOWLANEJ: 1273/366
DATA OPRACOWANIA:	CZERWIEC 2026 R.

OPRACOWAŁ:

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ WRĘCZYCKI	DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR UPR.: 19/SLOKK/2015	ARCHITEKTURA	CZERWIEC 2026 R.	
PROJEKTANT	MGR INŻ. KRZYSZTOF GAWROŃSKI	DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ NR UPR.: 136/2001	KONSTRUKCJA	CZERWIEC 2026 R.	

4.1 PODSTAWY FORMALNE SPORZĄDZENIA INFORMACJI:

- Prawo Budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz 1126)
- Zlecenie Inwestora

4.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności:

- Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie.
- Roboty budowlane dotyczące rozbiórki – demontaż drzwi, okien, oraz rozbiórka ścian, stropów i konstrukcji dachów, fundamentu.

4.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (NP. SIECI)

Wszystkie media na placu budowy.

4.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Koparka

4.5 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- Ryzyko przygniecenia ciężkim elementem - w trakcie użycia koparki oraz ryzyko przygniecenia ciężkim elementem – w trakcie rozbiórki stropu.
- Uderzenie pracownika spadającym narzędziem itd.
- Wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się).

4.6 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4.2
- Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 4.5
- Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji kierownik robót powinien opracować Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się zapoznać z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poświadczają na sporządzonej przez kierownika robót liście.

Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas szkolenia:

- rodzajów możliwych występujących zagrożeń
- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
- zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

4.7 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

- Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych
- Stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy
- Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych)
- Przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu,
- Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu
- Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj sieci

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

